

**ОПЫТ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»**

Дмитрий Вячеславович Березовский

Заместитель Главы города, начальник управления
дорожного хозяйства и благоустройства



НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА КЕМЕРОВО

560 ТЫС. ЧЕЛОВЕК



ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ

+3 ТЫС.
ЧЕЛОВЕК

ДОРОГИ КЕМЕРОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

1 081,8 КМ



ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ГОРОДА КЕМЕРОВО



РАВНЫЕ ПО НАСЕЛЕНИЮ

ПРАВЫЙ И ЛЕВЫЙ БЕРЕГА Р.ТОМИ

ДВА АВТОМОБИЛЬНЫХ МОСТА

ПО ТРИ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ В КАЖДОМ
НАПРАВЛЕНИИ

ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕЗДА ГОРОДА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТРАССА

Р-255 «СИБИРЬ»

ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ВЕСЬ ГОРОД

РОСТ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ



203 298

ЕДИНИЦ ТРАНСПОРТА

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В КЕМЕРОВЕ

6%

ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ
АВТОМОБИЛЕЙ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТРАССА Р-255 «СИБИРЬ»



44 ПЕРЕКРЁСТКА

ПРОЕЗЖАЕТ

ТРАНЗИТНЫЙ ТРАНСПОРТ


НА ЭТОМ ПУТИ

14 РЕГУЛИРУЕМЫХ


ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

УВЕЛИЧЕНИЕ

НА **35%**

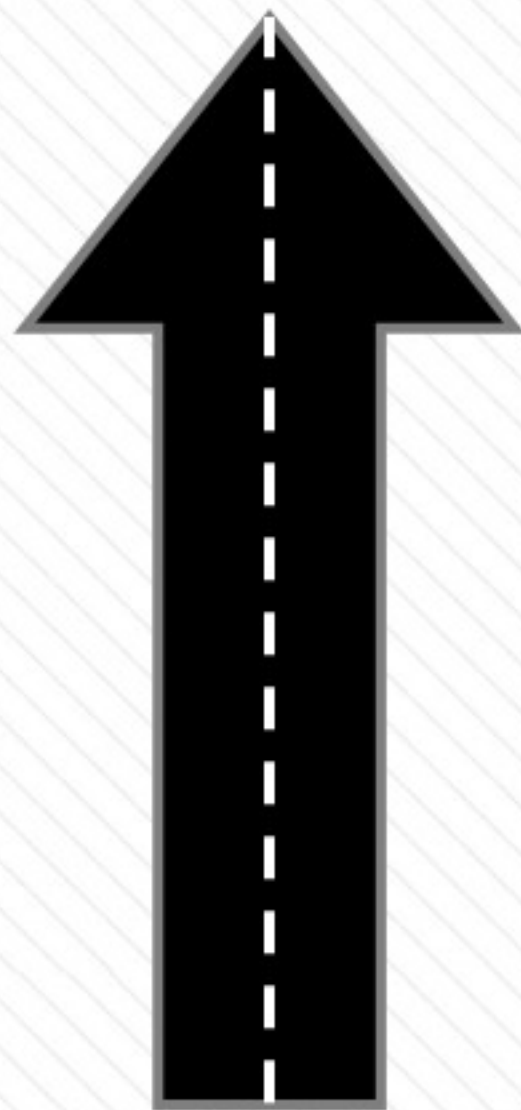

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ ГОРОЖАН И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММЫ

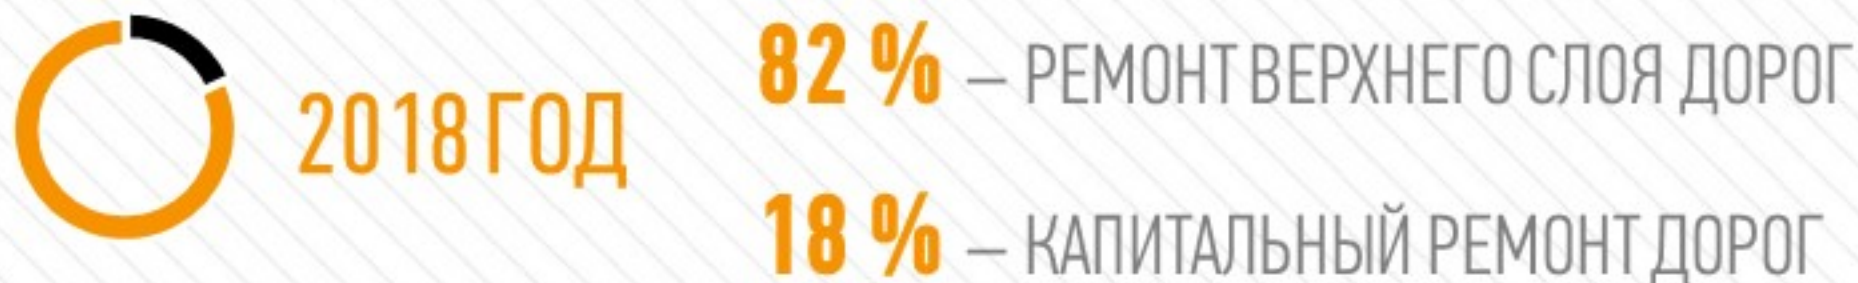

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

380 млн руб.
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

680 млн руб.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ



300 млн руб.
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

ФИНАНСИРОВАНИЕ НА 2019 ГОД **1 360** млн руб.

ИТОГИ ПРОГРАММЫ ЗА 2 ГОДА

2017-2018 ГОДА

138 ОБЪЕКТОВ

80

УЧАСТКОВ
ДОРОВ



58

ОБЪЕКТОВ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

2019 ГОД

66 ОБЪЕКТОВ

57

УЧАСТКОВ
ДОРОВ



9

ОБЪЕКТОВ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
ДОРОВ

КАКИЕ ДОРОГИ ВКЛЮЧИЛИ В ПРОЕКТ



ВЫСОКИЙ ИЗНОС
ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ



МАРШРУТЫ
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА



ИНТЕНСИВНОЕ
ДВИЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ



ОБЩЕСТВЕННОЕ
МНЕНИЕ



ИТОГИ ПРОГРАММЫ ЗА 2 ГОДА

152,71 КМ

ДОРОГ

ОТРЕМОНТИРОВАНО В 2017-2018 ГОДАХ

63,31 КМ

ДОРОГ ПЛАНИРУЕТСЯ

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ В 2019 ГОДУ

ВСЕГО ЗА 3 ГОДА БУДЕТ
ОТРЕМОНТИРОВАНО

216,02 КМ



ИТОГИ ПРОГРАММЫ ЗА 2 ГОДА

ПЛАН НА 2019 год

18 РУБЕЖЕЙ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ

8 10

11 СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ

5 6 8

10 АВТОПАВИЛЬОНОВ

5 5

2017 год

2018 год

ИТОГИ ПРОГРАММЫ ЗА 2 ГОДА

ПЛАН НА 2019 год

1953 ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

1 571

382

-

7,89 км ОГРАЖДЕНИЙ

2,8 км

5,09 км

1,6 км

2017 год

2018 год



ИТОГИ ПРОГРАММЫ ЗА 2 ГОДА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ КОНЦЕНТРАЦИИ ДТП




■ БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 2016 Г. (100 %),
ПЕРЕХОДЯЩИЕ С ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА

■ ВНОВЬ ОБРАЗОВАВШИЕСЯ



ИТОГИ ПРОГРАММЫ ЗА 2 ГОДА

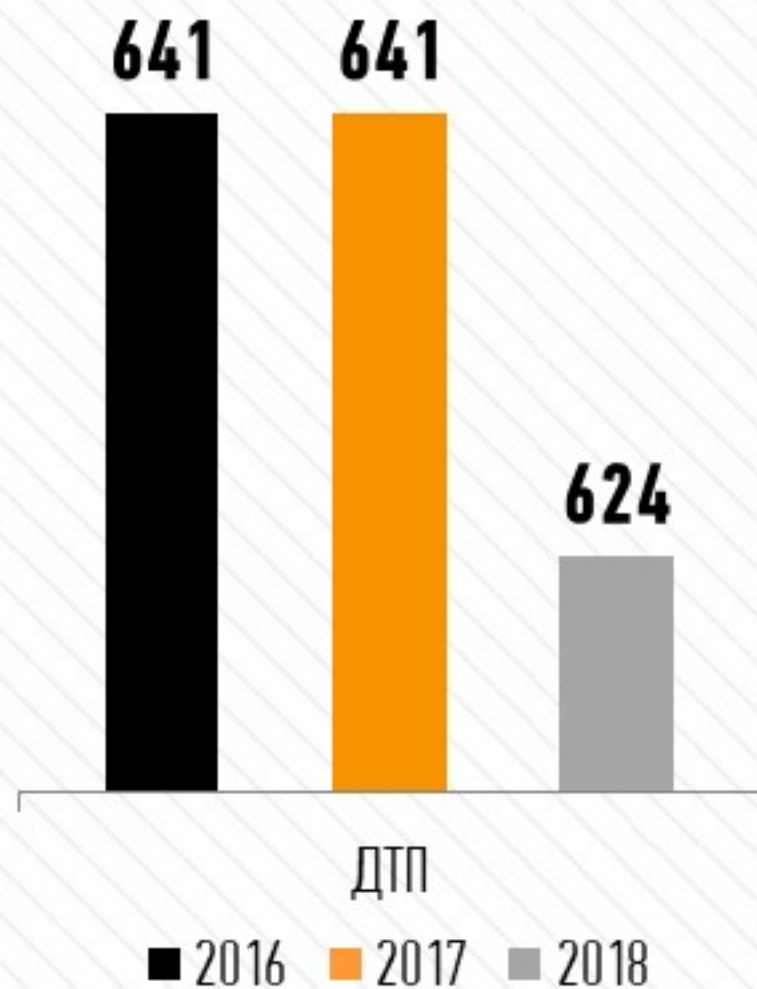

ИТОГИ ПРОГРАММЫ ЗА 2 ГОДА

1

ЦЕЛЬ

ПОВЫСИТЬ ДОЛЮ ДОРОГ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

РЕЗУЛЬТАТ

В 2017 ГОДУ – 43% (219 км)

В 2018 ГОДУ НОРМАТИВУ СООТВЕТСТВУЮТ 56,8% (271,9 км) ДОРОГ

2

ЦЕЛЬ

УМЕНЬШИТЬ КОЛИЧЕСТВО АВАРИЙНО-ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ НА ДОРОГАХ ГОРОДА

РЕЗУЛЬТАТ

В 2017 ГОДУ ЛИКВИДИРОВАНО 16 УЧАСТКОВ, 7 ВНОВЬ ОБРАЗОВАВШИХСЯ

В 2018 ГОДУ ЛИКВИДИРОВАНО 12 УЧАСТКОВ, 17 ВНОВЬ ОБРАЗОВАВШИХСЯ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА



ДОРОЖНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ ДОРОГ



ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ
ПО ВЫБОРУ ОБЪЕКТОВ
РЕМОНТА

ГРАФИК РАБОТ

Январь								Февраль								Март								Апрель							
На	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС	На	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС	На	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС	На	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
1		1	2	3	4	5	6	5				1	2	3	9				1	2	3	14	1	2	3	4	5	6	7		
2	7	8	9	10	11	12	13	6	4	5	6	7	8	9	10	10	4	5	6	7*	8	9	10	15	8	9	10	11	12	13	14
3	14	15	16	17	18	19	20																		17	18	19	20	21		
4	21	22	23	24	25	26	27	8	18	19	20	21	22*	23	24	12	18	19	20	21	22	23	24	17	22	23	24	25	26	27	28
5	28	29	30	31				9	25	26	27	28				13	25	26	27	28	29	30	31	18	29	30*					

ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ, ПОДПИСАНИЕ КОНТРАКТОВ

Май								Июнь								Июль								Август							
На	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС	На	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС	На	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС	На	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
18			1	2	3	4	5	22				1	2	27	1	2	3	4	5	6	7	31				1	2	3	4		
19	6	7	8*	9	10	11	12	23	3	4	5	6	7	8	9	28	8	9	10	11	12	13	14	32	5	6	7	8	9	10	11
20	13	14	15	16	17	18	19	24	10							30	22	23	24	25	26	27	28	34	19	20	21	22	23	24	25
21	20	21	22	23	24	25	26	25	17	18	19	20	21	22	23	31	29	30	31					35	26	27	28	29	30	31	
22	27	28	29	30	31			26	24	25	26	27	28	29	30																

ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Сентябрь								Октябрь								Ноябрь								Декабрь							
На	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС	На	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС	На	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС	На	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
35						1	40	1	2	3	4	5	6	44				1	2	3	48										
36								2	9	10	11	12	13	45							10	49	2	3	4	5	6	7	8		
37	9	10	11	12	13	14	15	42	14	15	16	17	18	19	20	46	11	12	13	14	15	16	17	50	9	10	11	12	13	14	15
38	16	17	18	19	20	21	22	43	21	22	23	24	25	26	27	47	18	19	20	21	22	23	24	51	16	17	18	19	20	21	22
39	23	24	25	26	27	28	29	44	28	29	30	31				48	25	26	27	28	29	30		52	23	24	25	26	27	28	29
40	30							45																							

ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗАЩИТА ПРОЕКТА

ЗАЩИТА ПРОЕКТА

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



РАБОТА С ПОДРЯДЧИКАМИ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПОДРЯДЧИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕЛИ:

35 ЕДИНИЦ СПЕЦТЕХНИКИ


САМЫЙ КРУПНЫЙ ЗА УРАЛОМ ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ

4 АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА


2 АВТОГУДРОНАТОРА

1 ФРЕЗА

10 ДОРОЖНЫХ КАТКОВ

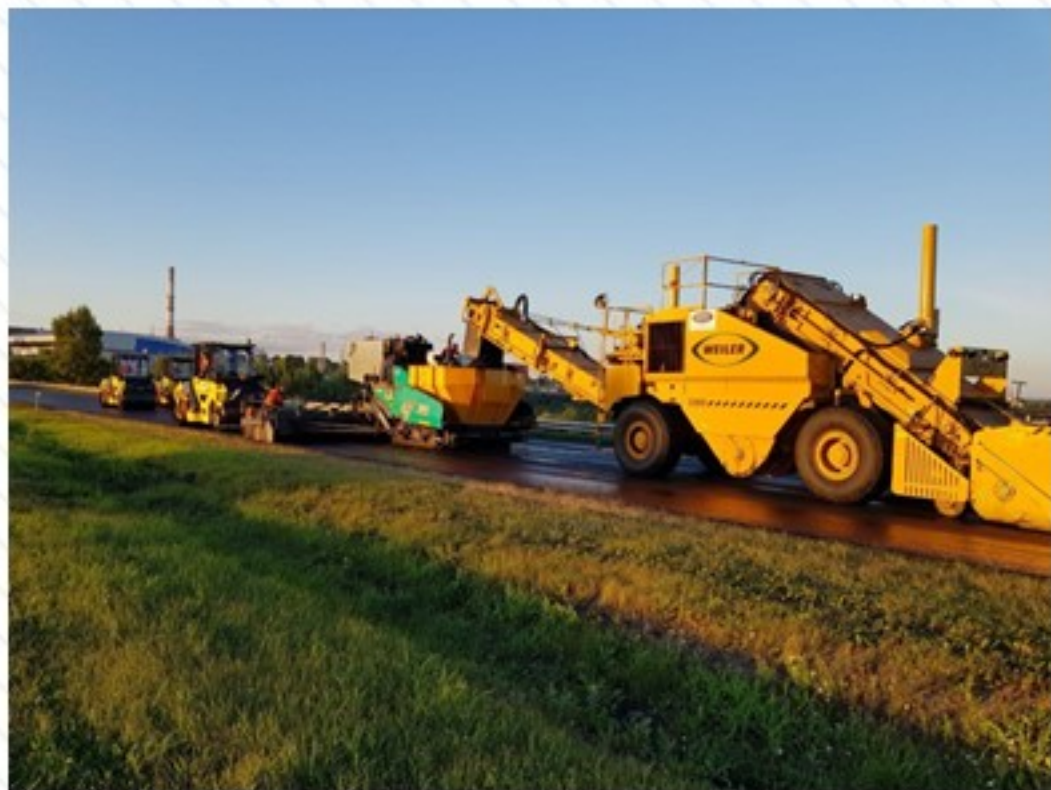

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОСТАВА АСФАЛЬТОБЕТОНА

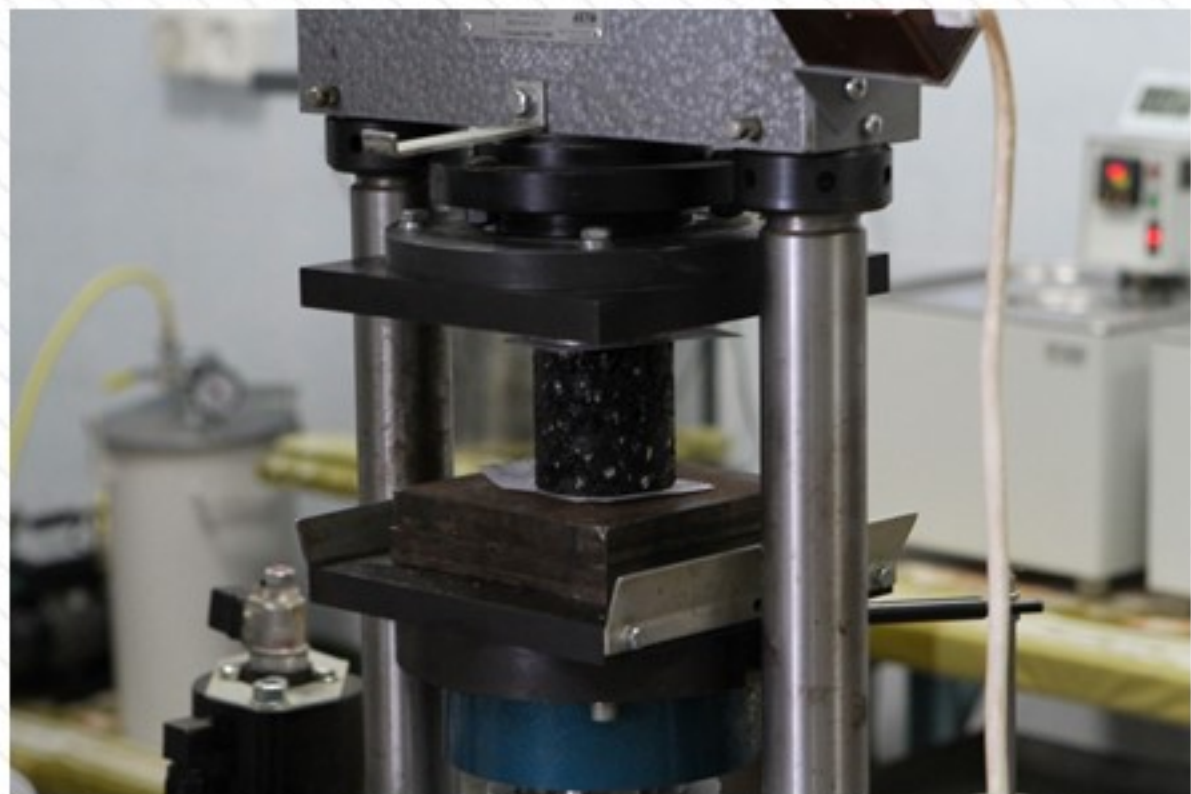

ЩЕБЕНЬ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД

НОВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ АДГЕЗИОННАЯ
ДОБАВКА

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

1

ВНУТРЕННИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ
ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2

ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАКАЗЧИКА

3

НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЬ «КУЗБАССКОГО ЦЕНТРА ДОРОЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

4

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5

КОНТРОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА

5 УРОВНЕЙ
КОНТРОЛЯ

КОНТРОЛЬ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



ПРОВЕДЕНА РЕВИЗИЯ ОБЪЕКТОВ 2017 ГОДА
ВЫЯВЛЕНО 80 ГАРАНТИЙНЫХ СЛУЧАЕВ

73 УСТРАНЕНО ПОДРЯДЧИКОМ
7 НЕ ПОДТВЕРДИЛОСЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

СРОК ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ОТ **4** ДО **6** ЛЕТ В 2017 ГОДУ И
5 ЛЕТ В 2018 ГОДУ

В 2019 ГОДУ БУДЕТ ПРОВЕДЕНА РЕВИЗИЯ ОБЪЕКТОВ 2017-2018 ГОДОВ

В ПЕРИОД С 30.04.2019 ПО 30.06.2019

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ

БУЛЬВАР СТРОИТЕЛЕЙ



2017 год

РЕМОНТ ДОРОГИ

2017-2018 гг.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ

2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ УЧАСТКА ДОРОГИ

2019 год

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНОГО
КОЛЬЦА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С
ПРОСП. ПРИТОМСКИМ

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ

УЛИЦА НАХИМОВА

УЧАСТОК ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЫ Р-255 «СИБИРЬ»



2017 год

РЕМОНТ
УЧАСТКА ДОРОГИ

2018 год

КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ УЧАСТКА ДОРОГИ

2019 год

РЕМОНТ
УЧАСТКА ДОРОГИ

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ 6.6 КМ.



2017–2018 гг.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ

2019 год РЕМОНТ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ДОРОГИ

УЛ. НАЗАРОВА

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ



2017 год

ОБНАРУЖЕНА БРУСЧАТКА,
УЛОЖЕННАЯ В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА

2018 год

ПЕРЕНЕСЛИ БРУСЧАТКУ
В ОБНОВЛЕННЫЙ СКВЕР «ОРБИТА»

2018 год

ОБНАРУЖИЛИ ШПАЛЫ И РЕЛЬС
ПЕРВОЙ ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ 1940 ГОДА

ПОМЕСТИЛИ В МУЗЕЙ



КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО



65,8 МЛН РУБЛЕЙ

ЗАМЕНА И РЕМОНТ
БОРТОВОГО КАМНЯ

РЕМОНТ
ТЕХНИЧЕСКИХ И ПЕШЕХОДНЫХ
ТРОТУАРОВ

КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО



10,7 МЛН РУБЛЕЙ

ОБУСТРОЙСТВО
ПАНДУСОВ

КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО



6,9 МЛН РУБЛЕЙ

УСТАНОВКА
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО



16,8 МЛН РУБЛЕЙ

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО



1,5 МЛН РУБЛЕЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ЗАЕЗДНЫХ
КАРМАНОВ

НА ОСТАНОВКАХ ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА

КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО



7,5 МЛН РУБЛЕЙ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- НАРЕЗКА КЮВЕТОВ
- УКЛАДКА ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ
- РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ

КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО



2,2 МЛН РУБЛЕЙ

ОКРАСКА И РЕМОНТ

ЖЕСТКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ
ОГРАЖДЕНИЙ

110,4 млн руб.

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



ИСКЛЮЧЕНИЕ

ОДНОВРЕМЕННЫХ РАБОТ
НА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ УЛИЦАХ

ЗАКРЫТИЕ

НЕ БОЛЕЕ 1 ПОЛОСЫ

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ

36 КАМЕР

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
НА ПЕРЕКРЕСТКАХ

КВАДРОКОПТЕР

ДЕЖУРСТВО

СОТРУДНИКОВ ГИБДД

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

РЕМОНТ ДОРОГ В РАЙОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ



200 УЛИЦ
ОТРЕМОНТИРОВАНО

АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ СКОЛОМ
ЗА 2 ГОДА

ПЛАНИРУЕТСЯ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ СКОЛОМ
ЗА 2019 ГОД - 50 УЛИЦ





УЛУЧШЕНИЕ

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РЕАГИРОВАНИЕ И ОТРАБОТКА КУРАТОРАМИ

СООБЩЕНИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СИСТЕМЕ «ИНЦИДЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ»
(6-8 ЧАСОВ)

УВЕЛИЧЕНИЕ

ОБЪЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ И
ВИДЕОПРОДУКЦИИ





2 307

СООБЩЕНИЙ В СМИ

ВЫШЛО В ХОДЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ
ПО ПРОЕКТУ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
ДОРОГИ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ГАЗЕТА - АФИША - КАПИТАЛ - ПТИЦА - ГОРОДСКАЯ ДОСТАВКА
ДОРОЖНИКИ - КОЛОДЕЦ - КОПИМ - ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА - РЕКОНСТРУКЦИЯ - КЕМЕРОВСКИЕ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

ГАЗЕТА КЕМЕРОВА

ДОБАВИТЬ НА ВИНДЕКС АРХИВ


НОВОСТИ СТАТЬИ ПРОЕКТЫ ФОТОРЕПОРТАЖИ ТРАНСЛЯЦИИ КОМПАНИИ ВИДЕО БЛОГ «ЗДОРОВОГО ГОРОДА» НЕФОРУМ

РЕМОНТ ПРОСПЕКТА СОВЕТСКОГО В КЕМЕРОВЕ ПОКАЗАЛИ ЗА 40 СЕКУНД

Евгения Фёдорова, 10 октября 2018, 10:29

Во «ВКонтакте» в группе, посвящённой проекту «безопасные и качественные дороги» в Кемерове, появилось видео ремонта проспекта Советского. Оно снято в режиме таймлапс.

таймлапс советский застроен кемерово

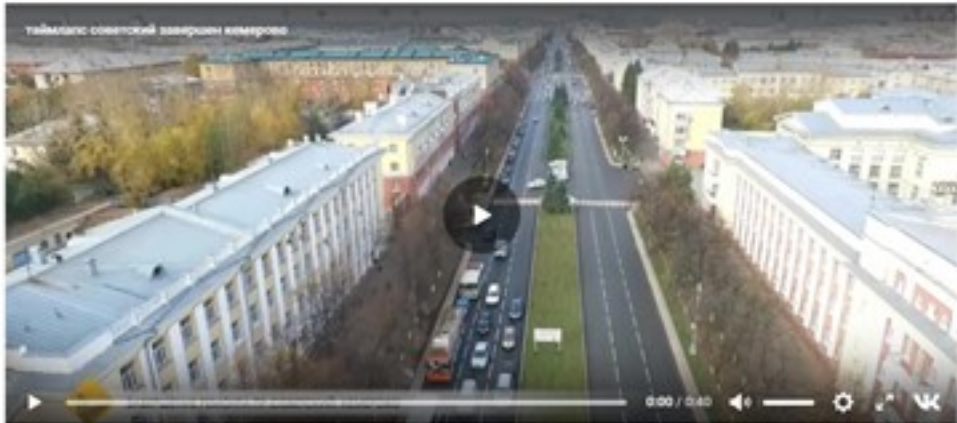

Капитальный ремонт дороги проводился на протяжении трёх месяцев. Здесь заменили ливневую канализацию, уложили новые трубы, произвели укладку асфальта и нанесли разметку. В видео все эти работы показаны всего за 40 секунд.

Видео: vk.com

Метки: Кемерово, Безопасные И Качественные Дороги, Ремонт

Поделись

427

пресс-релизов о ремонтной кампании за 2 года реализации проекта

219

видеосюжетов на телевидении

194

сообщения в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте»

187

публикаций в печатных СМИ

ИТОГИ ПРОЕКТА – 2018



150 ТЫСЯЧ
АВТОМОБИЛИСТОВ

ЕЖЕДНЕВНО ПОЛЬЗУЮТСЯ
ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

300 ТЫСЯЧ
ПЕШЕХОДОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ



СНИЗИЛОСЬ
КОЛИЧЕСТВО ЖАЛОБ
НА ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ ДОРОГ



2016 год – **511**

2017 год – **212**

2018 год – **167**



**ОПЫТ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»**

Дмитрий Вячеславович Березовский

Заместитель Главы города, начальник управления
дорожного хозяйства и благоустройства

